SlowTourism

Projekt, sofinanciran s strani EU

Predstavitev za OS OŽ

PROJEKT PP13 –

Ureditev rekreacijskega parka Završnica

/Zavod za turizem in kulturo Žirovnica/

Ref. 1/2009 / SLOW TOURISM/ Valorizzazione e promozione di itinerari turistici "slow" tra l'Italia e la Slovenia

Ref. 1/2009/ SLOW TOURISM /Valorizacija in promocija turističnih “slow” poti med Italijo in Slovenijo

Zavod za turizem in kulturo ŽIROVNICA

Maja Zupan
Janez Dolžan
Žirovnica, 26. januar 2012

2007-2013

cooperazione territoriale eur
programma per la cooperazio
transfrontaliera
Italia-Slovenia

evropsko teritorialno sodelov
program čezmejnega sodelov
Slovenija-Itali

Investiamo nel vostro futuro!

Naložba v vašo prihodnost!

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo e
sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj

Agenda

Žirovnica, seja OS OŽ, 26.1.2012

I. Prerez stanja projekta “Ureditev rekreacijskega parka Završnica”
II. Trenutne aktivnosti na projektu in aktivnosti v pripravi
III. Pilotni projekt in umestitve v prostor
IV. Časovnica
V. Finančni plan

I. Prerez stanja projekta “Ureditev rekreacijskega parka Završnica”

Izvedeno:

- ✓ 8 sestankov projektne skupine za ureditev rekreacijskega parka
- ✓ več sestankov in ogledov s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine in predstavniki Zavoda za varstvo narave
- ✓ pripravljen Elaborat za izvedbo in opremo
- ✓ določene mikrolokacije postavitve opreme
- ✓ oddana tri vmesna poročila; že povrnjena sredstva za prvo
- ✓ uspešna realokacija fin. sredstev

II. Trenutne aktivnosti na projektu in aktivnosti v pripravi

V teku in pripravi:

- ✓ naknadni sestanki z ZVKD in ZVN (januar in februar 2012)
- ✓ specifikacija opreme pilotnega projekta (februar 2012)
- ✓ pridobitev služnostnih pravic na parcelah, kjer bodo izvedene umestitve (februar 2012)
- ✓ javni razpis (portal) za dobavo in postavitev opreme (marec 2012)
- ✓ predstavitev projekta občanom (april 2012)
- ✓ upravljavski načrt (junij - julij 2012)

III. Pilotni projekt in umestitve v prostor

V okviru pilotnega projekta bodo izvedene naslednje umestitve v prostor:

- ✓ postavitev otroškega igrišča
- ✓ ureditev trim steze
- ✓ ureditev manjših prostorov za piknik
- ✓ postavitev dveh montažnih igrišč za odbojko na mivki
- ✓ postavitev montažnega objekta s kemičnima WC

UMESTITVE V PROSTOR

Završniško jezero z okolico

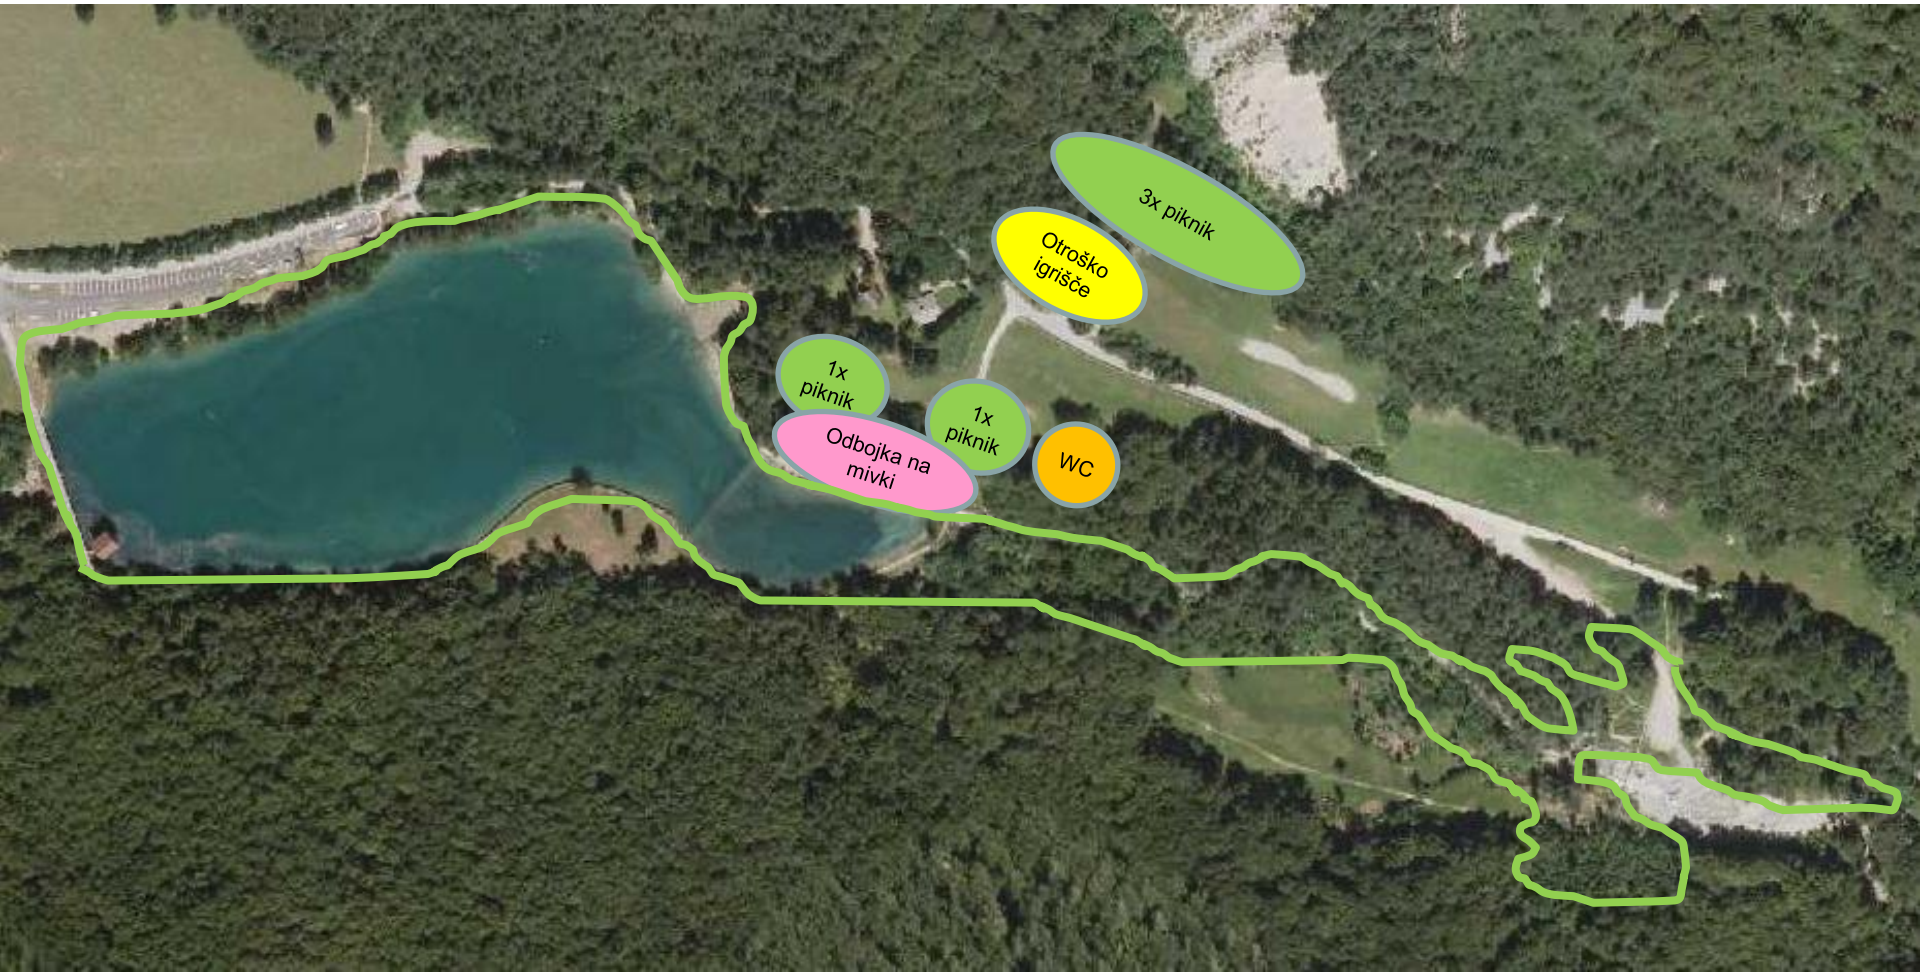

DOLINA ZAVRŠNICE

Postavitev otroškega igrišča

DOLINA ZAVRŠNICE

Ureditev trim steze

10 postaj
Dolžina proge: 2100 m

DOLINA ZAVRŠNICE

Ureditev manjših prostorov za piknik

5 piknik prostorov
Velikost cca. 40 m2 / prostor

DOLINA ZAVRŠNICE

Postavitev dveh montažnih igrišč za odbojko na mivki

DOLINA ZAVRŠNICE

Postavitev montažnega objekta s kemičnima WC

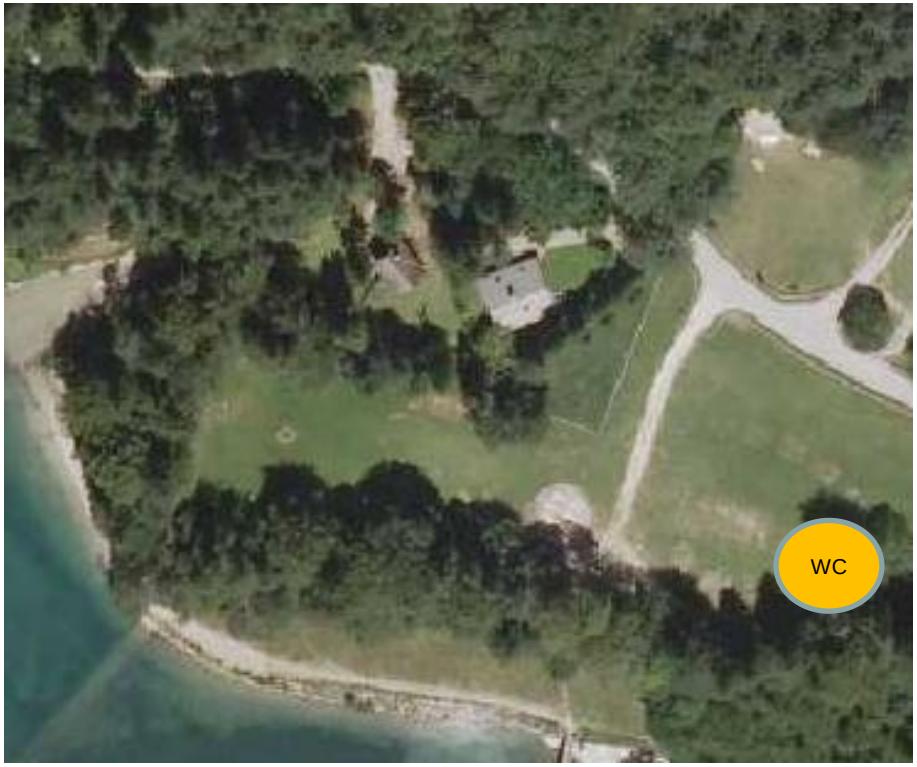

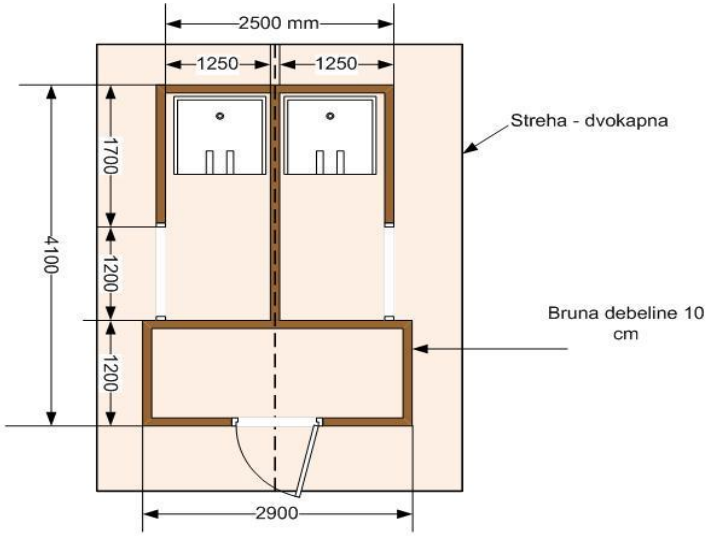

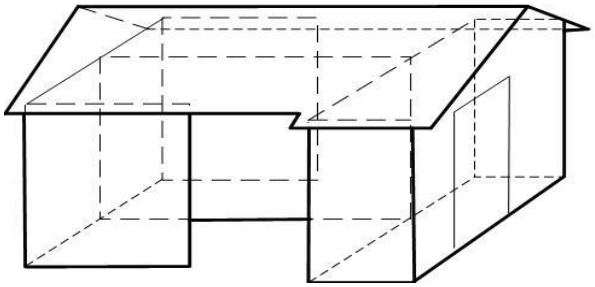

IV. ČASOVNICA

Nosilec: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Projekt: SLOW TOURISM

TERMINSKI PLAN ZA PROJEKT SLOWTOURISM

ažuriran 10. 1.2012

			2012								
Korak	**Naloga**	**Kdo**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**April**	**Maj**	**Jun**	**Jul**	**Avg**	**Sept**
UREDITEV OBMOČJA S TURISTIČNO INFRASTRUKTRUO											
1	pridobiti lokacijsko informacijo	ZTK	ok								
2	izdelati manjši projekt za izvedbo z načrtom postavitve	Kr arhitekt	ok								
3	specifikacija opreme	Kr arhitekt									
4	preveriti pogoje in lokacijo igrišča za odb. (brez posegov ki bi zahtevali GD oz nezahtevno GD)	Kr arhitekt	ok								
5	seznam parcel in lastnikov	ZTK	ok								
6	priprava služnostnih pogodb (služnost vsaj 5 let po zaključku projekta)	ZTK									
7	pridobitev služnosti - razgovori z lastniki (pokaže se jim načrt)	ZTK									
8	podpis pogodb pri notarju (organizira se v Čopovi hiši)	ZTK									
9	preveriti ali je potrebno soglasje Zavoda za varstvo narave,ga pridobiti	ZTK									
10	preveriti ali je potrebno soglasnje ARSO, ga pridobiti	ZTK									
11	pridobiti dovoljenje enostavno GD kjer je/ ce je potrebno	ZTK	ok								
12	izdelati javno naročilo: ločiti opremo od ureditvenih del	ZTK									
13	izvedba javnega naročila	ZTK									
14	izvedba gradbenih del/ zunanje urejanje tam, kjer je potrebno	zun izvajalec									
15	dobava in montaža opreme	zun izvajalec									
PROJEKTNE ZADEVE											
15	predlagati realokacijo, če se izkaze na osnovi PZI potrebno	ZTK	ok								
16	za pogoj "ustvarjanje prihodkov" bomo izdelali ob zagonu CBA analizo	zun izvajalec									
UPRAVLJANJE											
17	pri pravni službi občine se preveri ali lahko sklepamo neposredno pogodbo z društvom, ki deluje v javem interesu	ZTK	ok								
18	pripravi se program razpolaganja s premoženjem po zakonu o stvarnem premoženju / obvestilo o oddaji, ki se objavi na spletni strani	ZTK									
19	priprava pogodbe in pogojev pod katerimi se brezplačno oddaja	ZTK									
20	podpis pogodbe	ZTK									
21	otvoritev in pričetek upravljanja	upravljalec									

V. FINANČNI PLAN

WP	zadeva	plan 2012 in 2013	projekt skupaj	prvo vmesno poročilo	drugo vmesno poročilo	tretje vmesno poročilo
WP1	Vodja skupine	3.835,32 €	13.300,00 €	3.200,02 €	1.033,90 €	5.230,76 €
	Upravne in računovodske dejavnosti	7.200,00 €	7.200,00 €			
	Sodelovanje pri dejavnostih vodenja projekta	685,00 €	740,00 €	55,00 €		
	Poročanje in upravno vodenje	783,74 €	1.170,00 €		386,26 €	
	Nakup računalniške opreme	800,60 €	1.440,00 €	639,40 €		
	Splošni stroški za vodenje projekta, pisarniški izdelki …	2.931,92 €	3.000,00 €	68,08 €		
	Udeležba na uvodenem srečanju (ITA)	0,00 €	400,00 €	400,00 €		
	Udeležba na vmesnem srečanju (VE)	200,00 €	200,00 €			
	Udeležba na končnem srečanu (Kranj - SLO)	250,00 €	250,00 €			
		16.686,58 €	**27.700,00 €**	**4.362,50 €**	**1.420,16 €**	**5.230,76 €**
WP2	Sodelovanje pri pripravi smernic	3,74 €	1.000,00 €		996,26 €	
	Sodelovanje na delavnici s turističnimi operaterji	79,00 €	1.000,00 €			921,00 €
		82,74 €	**2.000,00 €**	**0,00 €**	**996,26 €**	**921,00 €**
WP3	priprava, načrtovanje in izvedba	7.505,28 €	10.000,00 €			2.494,72 €
	administracija	2.000,00 €	2.000,00 €			
	nakup opreme - kamini, korita, koši, otroško igrišče	17.000,00 €	17.000,00 €			
	Ureditev trim steze	25.000,00 €	25.000,00 €			
	igrišči za odbojko	42.000,00 €	42.000,00 €			
	Nakup opreme - brunarica in wc-ji	16.000,00 €	16.000,00 €			
		109.505,28 €	**112.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.494,72 €**
WP4	Zbiranje podatkov za promocijski material (lov, ribolov)	0,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €	
	Administracija	3.000,00 €	3.000,00 €			
	Soorganizacija, sodelovanje, koordiniranje in priprava srečanj	4.286,45 €	5.000,00 €		713,55 €	
	Promocija dogodkov	2.000,00 €	2.000,00 €			
	Sodelovanje pri pripravi turističnih paketov (pohodništvo)	1.000,00 €	1.000,00 €			
	izdatki za potovanje in nastanitev na izbranih sejmih dnevnica	2.500,00 €	2.500,00 €			
		12.786,45 €	**17.000,00 €**	**0,00 €**	**4.213,55 €**	**0,00 €**
WP5	sodelovanje pri usposabljanju mentorjev in vodičev	300	300,00 €			
		300,00 €	**300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
		139.361,05 €	**159.000,00 €**	**4.362,50 €**	**6.629,97 €**	**8.646,48 €**

Hvala za vašo pozornost!

SLOW TOURISM

Ref. 1/2009 / SLOW TOURISM/ Valorizzazione e promozione di itinerari turistici "slow" tra l'Italia e la Slovenia

Ref. 1/2009/ SLOW TOURISM /Valorizacija in promocija turističnih “slow” poti med Italijo in Slovenijo

PP13 – Ureditev rekreacijskega centra Završnica

Maja Zupan, Janez Dolžan

Ministero dell' Economia e delle Finanze

REPUBLIKA SLOVENIJA

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

2007-2013

cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione transfrontaliera
Italia-Slovenia

evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija

Investiamo nel vostro futuro!

Naložba v vašo prihodnost!

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj
